

แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่.....จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....
(ชื่อธนาคาร).....รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร).....ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา).....มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ

.....

.....(ชื่อผู้ลงนาม).....

.....(ชื่อธนาคาร).....



แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ


ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่..... จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีที่ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร..... (ชื่อธนาคาร)..... รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร)..... ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท (.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท (.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ

.....(ชื่อธนาคาร).....

**** เอกสารฉบับนี้จัดพิมพ์โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ****




ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | เดือน... |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| ที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | % |
|-----|-----------------|-------|-----------|--------------|----------|----|
| 1 | งานก่อสร้างเดิม | | | | | |
| | รายการ... | ลบ.ม. | | | | |
| 2 | งานผิวทาง | | | | | |
| | รายการ... | ลบ.ม. | | | | |
| | รายการ... | ตร.ม. | | | | |
| | รายการ... | ตร.ม. | | | | |
| | | | รวม | | | 0% |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Money | | | | | | | | |
| AccMoney | | | | | | | | |
| % PLAN | | | | | | | | |
| % ACC PLAN | | | | | | | | |
| % ACTUAL | | | | | | | | |
| % ACC ACTUAL | | | | | | | | |
| % ACC DIFF | | | | | | | | |
| % PLAN/2 | | | | | | | | |
| % PLAN/2 DIFF | | | | | | | | |

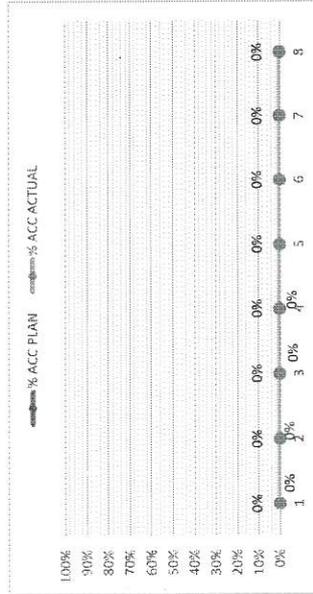

- หมายเหตุ:
- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสิ้นสัญญา จำนวน 8 เดือน หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)
 - 25 หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างซึ่งต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
 - Money มูลค่างานแต่ละรายการ จำนวนเงินจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
 - % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ค่าความคลาดเคลื่อนตามแผนดำเนินงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ




ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

| ที่ | รายการ งานก่อสร้างเดิม | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | % |
|-----|---------------------------|-------|-----------|--------------|-----------|------|
| 1 | งานรื้อโครงสร้างเดิม | | | | | |
| | a1 | ลบ.ม. | 100 | 5,000 | 500,000 | 16% |
| | a2 | ลบ.ม. | 120 | 2,000 | 240,000 | 8% |
| 2 | งานผิวทาง | | | | | |
| | b1 | ตร.ม. | 400 | 2,000 | 800,000 | 26% |
| | b2 | ตร.ม. | 300 | 5,000 | 1,500,000 | 49% |
| | | | รวม | | 3,040,000 | 100% |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ตค | | | | | | | | |
| พย | 25 | 25 | 25 | | | | | |
| ธค | | 50 | 50 | | | | | |
| มค | | | | 20 | | | | |
| กพ | | | | | 20 | | | |
| มีค | | | | | | 20 | | |
| เมย | | | | | | | 20 | |
| พค | | | | | | | | 25 |

| |
|---------------|
| Money |
| AccMoney |
| % PLAN |
| % ACC PLAN |
| % ACTUAL |
| % ACC ACTUAL |
| % ACC DIFF |
| % PLAN/2 |
| % PLAN/2 DIFF |

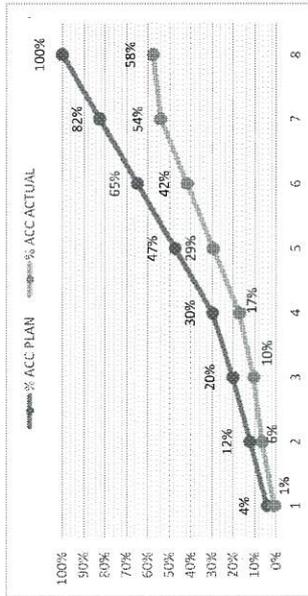

หมายเหตุ: 1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน

2) หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่อสร้างผิวทาง กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 5 เดือน

3) หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างตั้งดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานรื้อโครงสร้างเดิม ถือเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้

4) มูลค่างานแต่ละรายการ จำนวนจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ

5) ร้อยละของแผนดำเนินงาน จำนวนจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ




ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

| ที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | % | ระยะเวลาเกิน 1 ใน 2 | | | | | | | | |
|-----|----------------------|-------|-----------|--------------|-----------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|
| | | | | | | | เดือนที่ 1 | เดือนที่ 2 | เดือนที่ 3 | เดือนที่ 4 | เดือนที่ 5 | เดือนที่ 6 | เดือนที่ 7 | เดือนที่ 8 | |
| 1 | งานหรือโครงสร้างเดิม | ลบ.ม. | 100 | 5,000 | 500,000 | 16% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | |
| | | | ลบ.ม. | 120 | 2,000 | 240,000 | 8% | 50 | 50 | | | | | | |
| 2 | งานผิวทาง | ตร.ม. | 400 | 2,000 | 800,000 | 26% | | | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 30 | |
| | | | ตร.ม. | 300 | 5,000 | 1,500,000 | 49% | | | | | 10 | 25 | 25 | 25 |
| | | | รวม | | 3,040,000 | 100% | | | | | | | | | |

$(500,000 \times 20) = 100,000$
 100

$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29\%$

| | Money | AccMoney | % PLAN | % ACC PLAN | % ACTUAL | % ACC ACTUAL | % ACC DIFF |
|--------------|---------|----------|--------|------------|----------|--------------|------------|
| Money | 100,000 | 220,000 | 7.24% | 7.24% | 7.24% | 7.24% | 220,000 |
| AccMoney | 100,000 | 320,000 | 10.53% | 17.76% | 38.49% | 38.49% | 1,170,000 |
| % PLAN | 3.29% | 7.24% | 7.24% | 7.24% | 13.49% | 16.28% | 410,000 |
| % ACC PLAN | 3.29% | 10.53% | 10.53% | 17.76% | 38.49% | 54.77% | 1,665,000 |
| % ACTUAL | 0.66% | 5.07% | 5.07% | 3.62% | 9.44% | 11.40% | 495,000 |
| % ACC ACTUAL | 0.66% | 5.72% | 5.72% | 9.34% | 23.85% | 35.25% | 2,200,000 |
| % ACC DIFF | 2.63% | 4.80% | 4.80% | 8.42% | 14.64% | 19.52% | 535,000 |

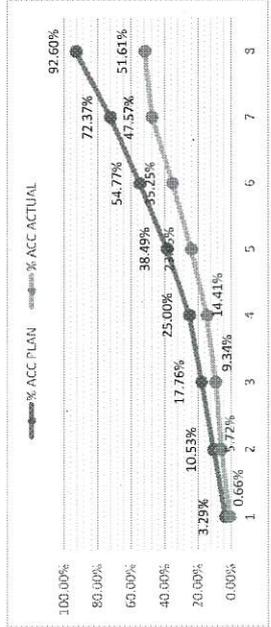

หมายเหตุ: 1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสิ้นสัญญา จำนวน 8 เดือน
 2) หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานหรือโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)
 3) หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างตั้งเป็นการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง (แต่ละรายการก่อสร้าง) รวมกัน 100 %
 4) Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
 5) AccMoney มูลค่างานสะสมในแต่ละเดือน
 6) % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานที่โครงการ
 7) % ACC PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงานสะสม
 8) % ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริง
 9) % ACC ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริงสะสม
 10) % ACC DIFF ร้อยละของความแตกต่างระหว่างการทำงานจริงเทียบกับแผนดำเนินงานสะสม



ผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ 25
 โดยความล่าช้าเป็นความผิดของผู้สัญญา


ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาเกิน 1 ปี

รวมยอดเงิน 1 ใน 2

รวมยอดเงิน 3 ใน 4

สิ้นสุดสัญญา

| เดือนที่ 1 | เดือนที่ 2 | เดือนที่ 3 | เดือนที่ 4 | เดือนที่ 5 | เดือนที่ 6 | เดือนที่ 7 | เดือนที่ 8 | เดือนที่ 9 | เดือนที่ 10 | เดือนที่ 11 | เดือนที่ 12 | เดือนที่ 13 | เดือนที่ 14 | เดือนที่ 15 | เดือนที่ 16 | เดือนที่ 17 | เดือนที่ 18 | เดือนที่ 19 | เดือนที่ 20 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| PR | PR | OR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR |
| 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 |




(500,000 X 20) = 100,000

100

| Money | AccMoney | % PLAN | % ACC PLAN | % ACTUAL | % ACC ACTUAL | % ACC DIFF | % PLAN/2 | % PLAN/2 DEF |
|-----------|-----------|---------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|
| 100,000 | 100,000 | 1.03% | 1.03% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% |
| 200,000 | 200,000 | 3.24% | 3.24% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 350,000 | 350,000 | 5.46% | 5.46% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 500,000 | 500,000 | 7.68% | 7.68% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 650,000 | 650,000 | 9.90% | 9.90% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 800,000 | 800,000 | 12.12% | 12.12% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 950,000 | 950,000 | 14.34% | 14.34% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 1,100,000 | 1,100,000 | 16.56% | 16.56% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 1,250,000 | 1,250,000 | 18.78% | 18.78% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 1,400,000 | 1,400,000 | 21.00% | 21.00% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 1,550,000 | 1,550,000 | 23.22% | 23.22% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 1,700,000 | 1,700,000 | 25.44% | 25.44% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 1,850,000 | 1,850,000 | 27.66% | 27.66% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 2,000,000 | 2,000,000 | 29.88% | 29.88% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 2,150,000 | 2,150,000 | 32.10% | 32.10% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 2,300,000 | 2,300,000 | 34.32% | 34.32% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 2,450,000 | 2,450,000 | 36.54% | 36.54% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 2,600,000 | 2,600,000 | 38.76% | 38.76% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 2,750,000 | 2,750,000 | 40.98% | 40.98% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 2,900,000 | 2,900,000 | 43.20% | 43.20% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 3,050,000 | 3,050,000 | 45.42% | 45.42% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 3,200,000 | 3,200,000 | 47.64% | 47.64% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 3,350,000 | 3,350,000 | 49.86% | 49.86% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 3,500,000 | 3,500,000 | 52.08% | 52.08% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 3,650,000 | 3,650,000 | 54.30% | 54.30% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 3,800,000 | 3,800,000 | 56.52% | 56.52% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 3,950,000 | 3,950,000 | 58.74% | 58.74% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 4,100,000 | 4,100,000 | 60.96% | 60.96% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 4,250,000 | 4,250,000 | 63.18% | 63.18% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 4,400,000 | 4,400,000 | 65.40% | 65.40% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 4,550,000 | 4,550,000 | 67.62% | 67.62% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 4,700,000 | 4,700,000 | 69.84% | 69.84% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 4,850,000 | 4,850,000 | 72.06% | 72.06% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 5,000,000 | 5,000,000 | 74.28% | 74.28% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 5,150,000 | 5,150,000 | 76.50% | 76.50% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 5,300,000 | 5,300,000 | 78.72% | 78.72% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 5,450,000 | 5,450,000 | 80.94% | 80.94% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 5,600,000 | 5,600,000 | 83.16% | 83.16% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 5,750,000 | 5,750,000 | 85.38% | 85.38% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 5,900,000 | 5,900,000 | 87.60% | 87.60% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 6,050,000 | 6,050,000 | 89.82% | 89.82% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 6,200,000 | 6,200,000 | 92.04% | 92.04% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 6,350,000 | 6,350,000 | 94.26% | 94.26% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 6,500,000 | 6,500,000 | 96.48% | 96.48% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 6,650,000 | 6,650,000 | 98.70% | 98.70% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 6,800,000 | 6,800,000 | 100.92% | 100.92% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |

105,000 X 100 = 1.71 %

5,840,000



- หมายเหตุ:
- กรณีเกิดข้อผิดพลาดจากการคำนวณค่าเงินจากสัญญา จำนวน 8 เดือน
 - หากมีข้อผิดพลาดจากการคำนวณค่าเงินจากสัญญา จำนวน 8 เดือน
 - หากมีข้อผิดพลาดจากการคำนวณค่าเงินจากสัญญา จำนวน 8 เดือน
 - Money
 - % PLAN

