

## แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว  
ผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่..... จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียน  
เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  
กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ  
ซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ  
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า  
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....  
(ชื่อธนาคาร).....รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร).....ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/  
บุคคลธรรมดา).....มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท  
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท  
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ

.....

.....(ชื่อผู้ลงนาม).....

.....(ชื่อธนาคาร).....



## แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว  
ผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่..... จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียน  
เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  
กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ  
ซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ  
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า  
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....  
(ชื่อธนาคาร)..... รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร)..... ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/  
บุคคลธรรมดา)..... มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท  
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท  
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ

.....(ชื่อธนาคาร).....


\*\* เอกสารฉบับนี้จัดพิมพ์โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ \*\*



ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

| ที่ | รายการ               | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | %  |
|-----|----------------------|-------|-----------|--------------|----------|----|
| 1   | งานรื้อโครงสร้างเดิม |       |           |              |          |    |
|     | รายการ....           | ลบ.ม. |           |              |          |    |
|     | รายการ....           | ลบ.ม. |           |              |          |    |
| 2   | งานผิวทาง            |       |           |              |          |    |
|     | รายการ....           | ตร.ม. |           |              |          |    |
|     | รายการ....           | ตร.ม. |           |              |          |    |
| รวม |                      |       |           |              |          | 0% |

| 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| เดือน... | เดือน... | เดือน... | เดือน... | เดือน... | เดือน... | เดือน... | เดือน... |
|          |          |          |          |          |          |          |          |

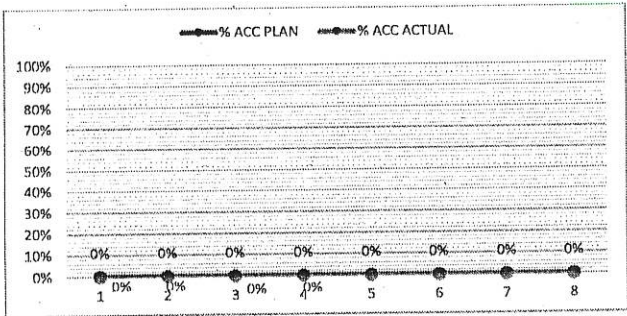

|               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Money         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AccMoney      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % PLAN        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % ACC PLAN    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % ACTUAL      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % ACC ACTUAL  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % ACC DIFF    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % PLAN/2      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % PLAN/2 DIFF |  |  |  |  |  |  |  |  |


หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำวันของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ



ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

| ที่ | รายการ               | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  | %    |
|-----|----------------------|-------|-----------|--------------|-----------|------|
| 1   | งานรื้อโครงสร้างเดิม |       |           |              |           |      |
|     | a1                   | ลบ.ม. | 100       | 5,000        | 500,000   | 16%  |
|     | a2                   | ลบ.ม. | 120       | 2,000        | 240,000   | 8%   |
| 2   | งานผิวทาง            |       |           |              |           |      |
|     | b1                   | ตร.ม. | 400       | 2,000        | 800,000   | 26%  |
|     | b2                   | ตร.ม. | 300       | 5,000        | 1,500,000 | 49%  |
|     | รวม                  |       |           |              | 3,040,000 | 100% |

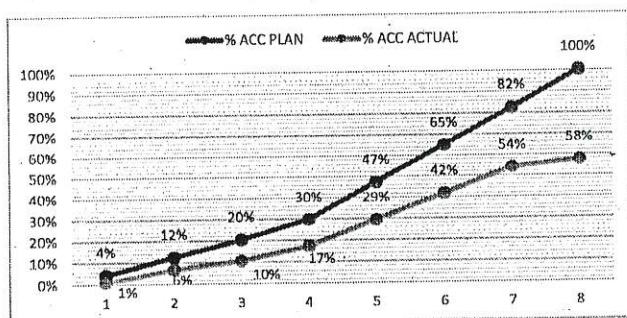

|               | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  |
|---------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|
|               | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค |
| Money         |    |    |    |    |    |     |     |    |
| AccMoney      |    |    |    |    |    |     |     |    |
| % PLAN        |    |    |    |    |    |     |     |    |
| % ACC PLAN    |    |    |    |    |    |     |     |    |
| % ACTUAL      |    |    |    |    |    |     |     |    |
| % ACC ACTUAL  |    |    |    |    |    |     |     |    |
| % ACC DIFF    |    |    |    |    |    |     |     |    |
| % PLAN/2      |    |    |    |    |    |     |     |    |
| % PLAN/2 DIFF |    |    |    |    |    |     |     |    |

หมายเหตุ:


- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่อสร้างผิวทาง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 5 เดือน
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานรื้อโครงสร้างเดิม ถือเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ



ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

| ที่ | รายการ               | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  | %    |
|-----|----------------------|-------|-----------|--------------|-----------|------|
| 1   | งานรื้อโครงสร้างเดิม |       |           |              |           |      |
|     | a1                   | ลบ.ม. | 100       | 5,000        | 500,000   | 16%  |
|     | a2                   | ลบ.ม. | 120       | 2,000        | 240,000   | 8%   |
| 2   | งานผิวทาง            |       |           |              |           |      |
|     | b1                   | ตร.ม. | 400       | 2,000        | 800,000   | 26%  |
|     | b2                   | ตร.ม. | 300       | 5,000        | 1,500,000 | 49%  |
|     | รวม                  |       |           |              | 3,040,000 | 100% |

$$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29\%$$

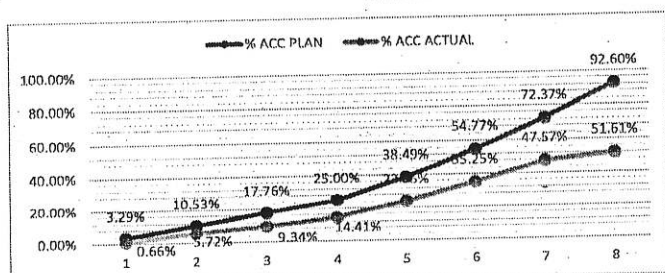

|              | ระยะเวลาเกิน 1 ใน 2 |            |            |            | ระยะเวลาเกิน 3 ใน 4 สิ้นสุดสัญญา |            |            |            |
|--------------|---------------------|------------|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|------------|
|              | เดือนที่ 1          | เดือนที่ 2 | เดือนที่ 3 | เดือนที่ 4 | เดือนที่ 5                       | เดือนที่ 6 | เดือนที่ 7 | เดือนที่ 8 |
|              | ตค                  | พย         | ธค         | มค         | กพ                               | มีค        | เมย        | พค         |
|              | 20                  | 20         | 20         | 20         | 20                               |            |            |            |
|              |                     | 50         | 50         |            |                                  |            |            |            |
|              |                     |            |            | 15         | 20                               | 15         | 20         | 30         |
|              |                     |            |            |            | 10                               | 25         | 25         | 25         |
| Money        | 100,000             | 220,000    | 220,000    | 220,000    | 410,000                          | 495,000    | 535,000    | 615,000    |
| AccMoney     | 100,000             | 320,000    | 540,000    | 760,000    | 1,170,000                        | 1,665,000  | 2,200,000  | 2,815,000  |
| % PLAN       | 3.29%               | 7.24%      | 7.24%      | 7.24%      | 13.49%                           | 16.28%     | 17.60%     | 20.23%     |
| % ACC PLAN   | 3.29%               | 10.53%     | 17.76%     | 25.00%     | 38.49%                           | 54.77%     | 72.37%     | 92.60%     |
| % ACTUAL     | 0.66%               | 5.07%      | 3.62%      | 5.07%      | 9.44%                            | 11.40%     | 12.32%     | 4.05%      |
| % ACC ACTUAL | 0.66%               | 5.72%      | 9.34%      | 14.41%     | 23.85%                           | 35.25%     | 47.57%     | 51.61%     |
| % ACC DIFF   | 2.63%               | 4.80%      | 8.42%      | 10.59%     | 14.64%                           | 19.52%     | 24.80%     | 40.99%     |

ผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ 25  
โดยความล่าช้าเป็นความผิดของผู้สัญญา

หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง (แต่ละรายการก่อสร้าง รวมกัน 100 %)
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- AccMoney มูลค่างานสะสมในแต่ละเดือน
- % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
- % ACC PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงานสะสม
- % ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริง
- % ACC ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริงสะสม
- % ACC DIFF ร้อยละของความแตกต่างระหว่างการทำงานจริงเทียบกับแผนดำเนินการสะสม



ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาเกิน 1 ปี

| ที่ | รายการ           | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  | %    |
|-----|------------------|-------|-----------|--------------|-----------|------|
| 1   | งานก่อสร้างเสริม | ลบ.ม. | 100       | 5,000        | 500,000   | 8%   |
|     |                  |       | 120       | 2,000        | 240,000   | 4%   |
|     |                  |       | 150       | 2,000        | 300,000   | 5%   |
|     |                  |       | 150       | 2,000        | 300,000   | 5%   |
| 2   | งานสีทา          | ตร.ม. | 400       | 2,000        | 800,000   | 13%  |
|     |                  |       | 200       | 5,000        | 1,000,000 | 16%  |
|     |                  |       | 300       | 10,000       | 3,000,000 | 49%  |
|     |                  |       |           |              | 6,140,000 | 100% |

| เดือนที่ 1 | เดือนที่ 2 | เดือนที่ 3 | เดือนที่ 4 | เดือนที่ 5 | เดือนที่ 6 | เดือนที่ 7 | เดือนที่ 8 | เดือนที่ 9 | เดือนที่ 10 | เดือนที่ 11 | เดือนที่ 12 | เดือนที่ 13 | เดือนที่ 14 | เดือนที่ 15 | เดือนที่ 16 | เดือนที่ 17 | เดือนที่ 18 | เดือนที่ 19 | เดือนที่ 20 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| คค         | พย         | ธค         | มค         | กพ         | มีค        | เมย        | พค         | มิย        | กค          | สค          | กย          | ตค          | พย          | ธค          | มค          | กพ          | มีค         | เมย         | พค          |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 20         | 20         | 15         | 15         | 50         |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |

|    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 20 | 20 | 15 | 15 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |    | 25 | 30 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |         |         |         |         |         |         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Money    | 100,000 | 100,000 | 135,000 | 75,000  |         | 360,000 | 410,000   | 310,000   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AccMoney | 100,000 | 200,000 | 335,000 | 410,000 | 410,000 | 770,000 | 1,180,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 |

|            |       |       |       |       |       |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| % PLAN     | 1.63% | 1.63% | 2.20% | 1.22% | 0.00% | 5.86%  | 6.68%  | 5.05%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % ACC PLAN | 1.63% | 3.26% | 5.46% | 6.68% | 6.68% | 12.54% | 19.22% | 24.27% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|              |    |    |    |    |    |    |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| % ACTUAL     | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 4% | 5%  | 1%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % ACC ACTUAL | 0% | 1% | 3% | 3% | 3% | 8% | 12% | 13% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|               |    |    |    |    |    |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| % ACC DIFF    | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% | 5%  | 7%  | 11% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % PLAN/2      | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 3%  | 3%  | 3%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % PLAN/2 DIFF | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1% | -1% | 2%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



- หมายเหตุ:
- 1) การคำนวณค่าจ้าง ค่าแรงระยะเวลาก่อสร้างตามแบบคำนวณค่าจ้างงานถึงสัญญา จำนวน 8 เดือน
  - 2) หมายถึง ระยะเวลาก่อสร้างตามแบบคำนวณค่าจ้างงานของฝ่ายราชการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างเสริม ค่าแรงระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาก่อสร้างสีทา)
  - 3) หมายถึง ระยะเวลาก่อสร้างที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแบบคำนวณค่าจ้างงานประจําเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง (นําค่ารายการก่อสร้าง รวมกัน 100 %)
  - 4) Money งบค่าจ้างแต่ละรายการ ค่าจ้างจากยอดคำนวณแบบคำนวณค่าจ้างงานของฝ่ายราชการ
  - 5) % PLAN ระยะของแบบคำนวณค่าจ้าง ค่าจ้างจากยอดคำนวณแบบคำนวณค่าจ้างงานประจําเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง

