

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าพลาสติก						
๔	หลอดไฟ						
๕	โคมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (ผู้สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

()



ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ


รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
 แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
 ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๘๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
 ()



2.40

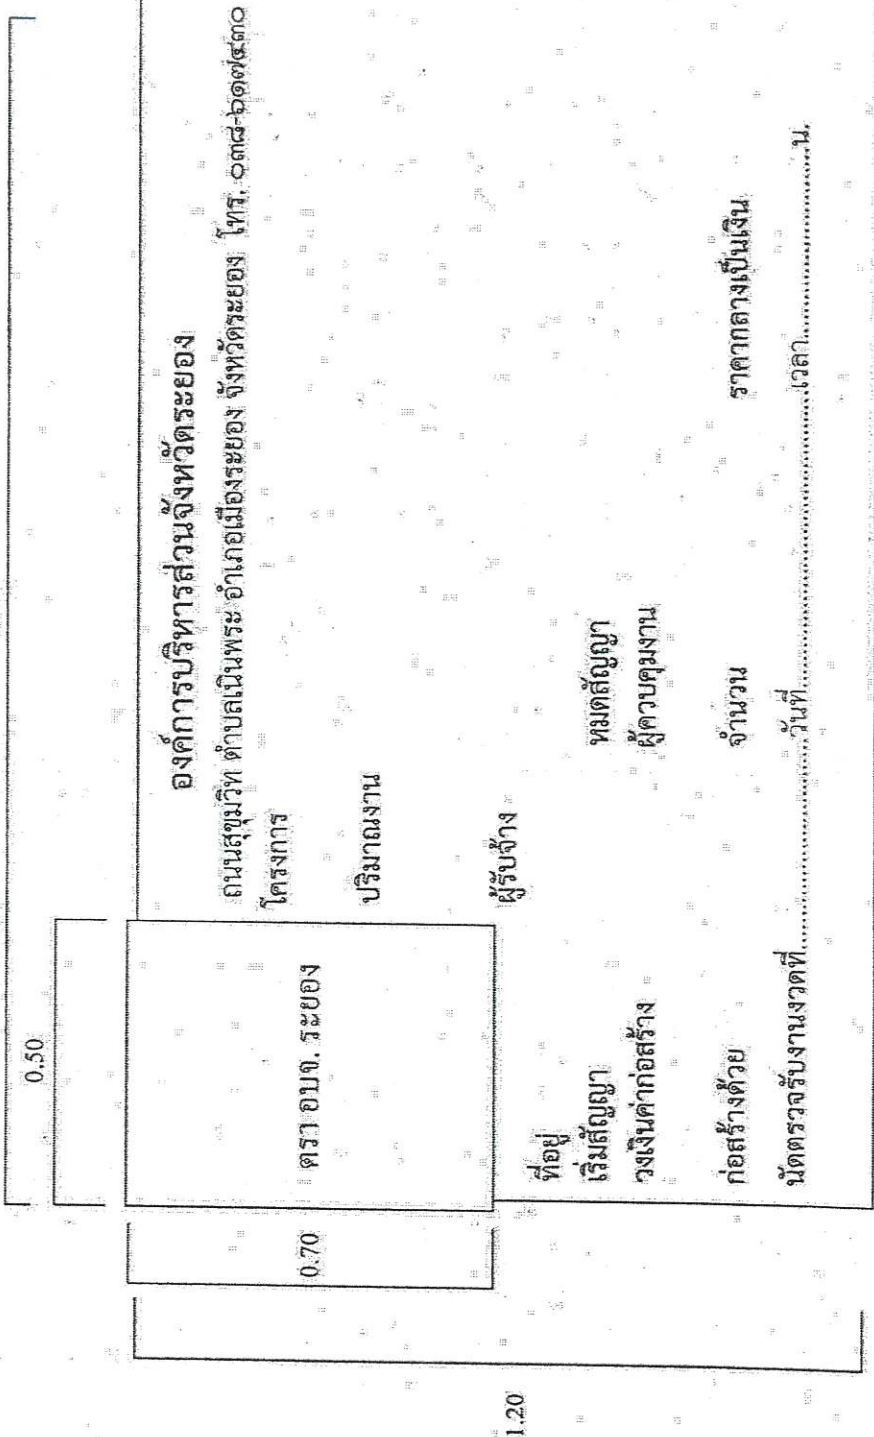

ป้ายระหวางค้ำบังเอกรก่อสร้าง 1-10

1. ป้ายไม้ขีด หน้า 4 มม.
2. พื้นสีเขียว ตัวอักษรสีขาว เส้นขอบหนา 0.025 ม.
3. เส้นและโครงข่ายให้เป็นรูปพรรณ: ติดตั้งและยึดโยงให้แข็งแรง
4. ตรา อบจ. ระย. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 เมตร
5. ขอบป้ายสีขาวหนา 0.025 เมตร

หมายเหตุ

- ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนป้ายโครงการติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้าง จำนวน 2 จุดตามรูปแบบกำหนดเฉพาะงานก่อสร้างที่มีความยาว เช่น ถนน, ขุดลอกคลอง, สะพานความยาว 30 ม. ขึ้นไป เป็นต้น
- สำหรับงานก่อสร้างที่ติดตั้ง จุด ๆ เดียวให้ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด เช่น อาคาร, ฝ่ายใกล้, สะพาน, ขุดสระ, สะพานความยาวไม่เกิน 30 ม. เป็นต้น




แบบเลขที่ ขบจ.ป-12343

แบบป้ายโครงการแบบ ก

(สำหรับโครงการที่มี มูลค่าก่อสร้างมากกว่า 500,000 บาท)

1 : 10

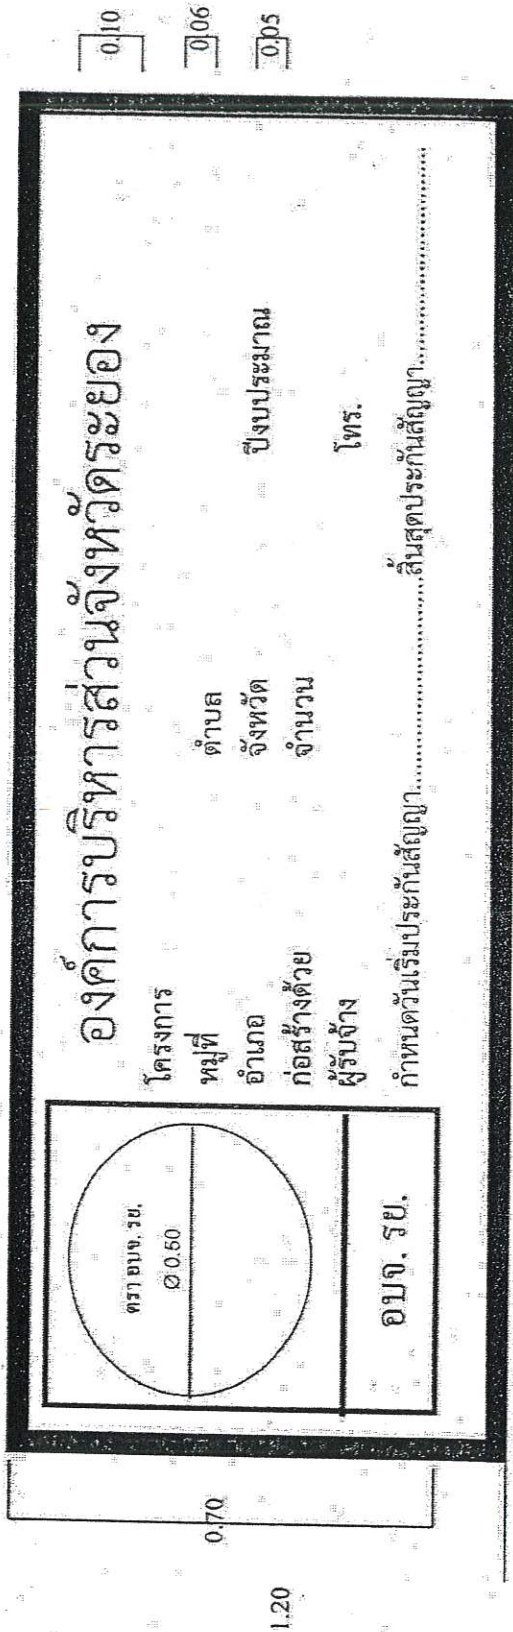

๐.10
๐.๐6
๐.๐5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

กำหนดวันเริ่มประกันสัญญา.....สิ้นสุดประกันสัญญา.....

หมายเหตุ

- ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนป้ายโครงการติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้าง จำนวน 2 จุดตามรูปแบบกำหนดเฉพาะงานก่อสร้างที่มีความยาว เช่น ถนน, ขุดลอกคลอง, สะพานความยาว 30 ม. ขึ้นไปเป็นต้น
- สำหรับงานก่อสร้างที่ติดตั้ง ณ จุด ๆ เดียวให้ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด เช่น อาคาร, ฝ่อท่ใต้ดิน, สะพาน, ขุดสระ, สะพานความยาวไม่เกิน 30 ม. เป็นต้น
- ให้ถนนหรือทางสาธารณะที่ไปด้วยสิบล้อไม่เกิน 2 ครั้ง, สิบล้อใช้สิบล้อที่ติดตั้งเครื่องหมายจราจร 2 ครั้ง
- จุดติดตั้ง, ระยะ, ความสูงต่าง ๆ ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด เพื่อความเหมาะสมของพื้นที่

รายละเอียดประกอบ

- ป้ายทำด้วยแผ่นเหล็กหนา 1.2 มม.
- เสาทำด้วยเหล็กรูปทรงกลม หรือเสา กสท. ขนาด ๐.10 x ๐.10 เมตร ทาสีขาว - โคนเสาทาสีสีฟ้าสูง ๐.50 ม. โดยรอบ
- พื้นติดตั้งต้อง ด้วยอิฐบดอัด
- ตรา อบจ. รย. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.50 เมตร
- กรอบป้ายสีดำหนา ๐.๐25 เมตร
- ความสูงของตัวอักษรขนาดใหญ่ ๐.10 เมตร
- ความสูงของตัวอักษรขนาดกลาง ๐.๐6 เมตร
- ความสูงของตัวอักษรขนาดเล็ก ๐.๐6 เมตร
- โครงการป้ายเหล็ก 1" x 1" ห่างจากขอบป้าย ๐.๐75 ม. โดยรอบ



แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่..... จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....
(ชื่อธนาคาร).....รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร).....ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา).....มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ

.....
.....(ชื่อผู้ลงนาม).....
.....(ชื่อธนาคาร).....



แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่..... จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ายื่นข้อเสนอเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีที่ยื่นข้อเสนอไม่มียกเว้นของกิจการหรือหน่วยงานทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....
(ชื่อธนาคาร)..... รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร)..... ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา)..... มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ

.....(ชื่อธนาคาร).....


**** เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ****



ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ หน่วย บาทต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างเดิม		
	รายการ....	ลบ.ม.	
	รายการ....	ลบ.ม.	
2	งานผิวทาง		
	รายการ....	ตร.ม.	
	รายการ....	ตร.ม.	
	รวม		0%

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...

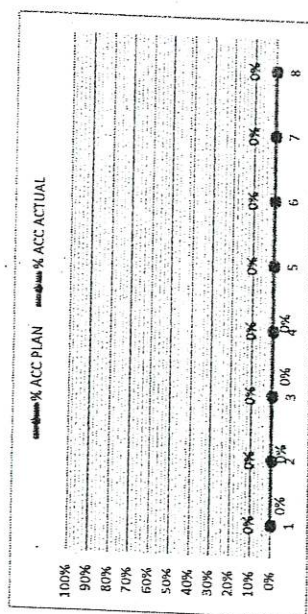[illegible]

- 1) กรณีตัวอย่าง
- 2) 
- 3) ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
หมายถึง ระยะเวลาก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการที่สร้า
- 4) มูลค่างานที่ผู้จ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานที่จะ
- 5) มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานที่เทียบกับมูลค่างานหรือร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินงานเพื่อการ


หมายเหตุ:



ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100		500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานฉาบผิว					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
				รวม	3,040,000	100%

	1	2	3	4	5	6	7	8
	0A	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A
Money								
AccMoney								
% PLAN								
% ACC PLAN								
% ACTUAL								
% ACC ACTUAL								
% ACC DIFF								
% PLAN/2								
% PLAN/2 DIFF								

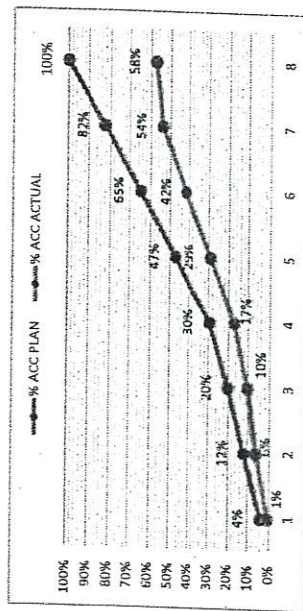


1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแบบร่างเป็นงานungsสัญญา จำนวน 8 เดือน

2) หมายความว่า ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่อสร้างผิวทาง กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 5 เดือน

25. หมายความว่า ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำปีของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานหรือโครงสร้างเดิม ถือเป็นร้อยละ 100 ของรายการนั้น

4)	Money	มูลค่าเงิน	การเปรียบเทียบมูลค่าเงินของตลาด
5)			


90 PLAN



ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินงานตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1 งานก่อสร้างเดิม					
a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2 งานฉาบผิวทาง					
b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
รวม				3,040,000	100%

$$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29\%$$

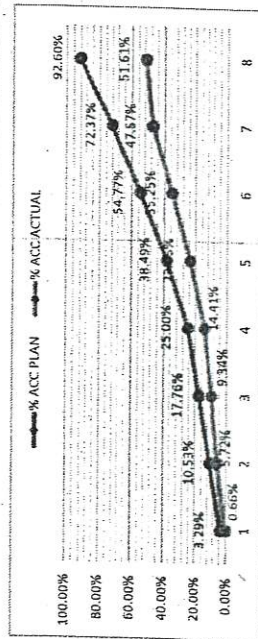

หมายเหตุ: 1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานที่สัญญา จำนวน 8 เดือน

2) หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานหรือโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างล่วงหน้า)

3) หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง (แต่ละรายการก่อสร้าง รวมกัน 100 %)

4) มูลค่างานแต่ละรายการ ค่ารวมจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ

5) มูลค่างานสะสมในแต่ละเดือน

6) ร้อยละของแผนดำเนินงาน ค่ารวมจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

7) ร้อยละของแผนดำเนินงานสะสม

8) ร้อยละของการดำเนินงานจริง

9) ร้อยละของการดำเนินงานจริงสะสม

10) ร้อยละของความแตกต่างระหว่างการทำงานจริงเทียบกับแผนดำเนินการสะสม

รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%	ระยะเวลาเกิน 1 ปี				ระยะเวลาเกิน 3 ปี			
						เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8
1 งานก่อสร้างเดิม						20	20	20	20	20	20	20	20
2 งานฉาบผิวทาง						20	20	20	20	20	20	20	20
รวม						40	40	40	40	40	40	40	40
Money						100,000	220,000	220,000	220,000	410,000	495,000	535,000	615,000
AccMoney						100,000	320,000	540,000	760,000	1,170,000	1,665,000	2,200,000	2,815,000
% PLAN						3.29%	7.24%	7.24%	7.24%	13.49%	16.28%	17.60%	20.23%
% ACC PLAN						3.29%	10.53%	17.76%	25.00%	38.49%	54.77%	72.37%	92.60%
% ACTUAL						0.66%	5.07%	3.62%	5.07%	9.49%	11.40%	12.32%	4.05%
% ACC ACTUAL						0.66%	5.72%	9.34%	14.41%	23.85%	35.25%	47.57%	51.61%
% ACC DIFF						2.63%	4.80%	8.42%	10.59%	14.64%	19.52%	24.80%	40.99%

มูลค่างานสะสมถึงรอบที่ 25 โดยความล่าช้าเป็นความล่าช้าของสัญญา



ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาเกิน 1 ปี

ปี	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%	ระยะเวลาเกิน 1 ปี 2												ระยะเวลาเกิน 1 ปี 4									
							เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8	เดือนที่ 9	เดือนที่ 10	เดือนที่ 11	เดือนที่ 12	เดือนที่ 13	เดือนที่ 14	เดือนที่ 15	เดือนที่ 16	เดือนที่ 17	เดือนที่ 18	เดือนที่ 19			
1	งานก่อสร้าง	a1	100	5,000	500,000	8%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
		a2	120	2,000	240,000	4%																						
		a4	150	2,000	300,000	5%																						
		a5	150	2,000	300,000	5%																						
2	งานบริหาร	b1	400	2,000	800,000	13%																						
		b2	200	5,000	1,000,000	16%																						
		b3	300	10,000	3,000,000	49%																						
		รวม			6,140,000	100%																						

105,000

5,840,000

X 100 = 1.71 %

Money

Accountancy

100,000

200,000

100,000

135,000

335,000

75,000

410,000

360,000

410,000

310,000

% PLAN

1.63%

1.63%

2.20%

1.22%

0.00%

5.66%

6.68%

5.05%

% ACC PLAN

1.63%

3.26%

5.46%

6.68%

6.68%

12.55%

19.22%

24.27%

% ACTUAL

0%

1%

1%

1%

0%

4%

5%

1%

% ACC ACTUAL

0%

1%

3%

3%

5%

7%

12%

13%

% ACC DIFF

1%

2%

3%

3%

5%

7%

11%

11%

% PLAN/2

1%

1%

1%

1%

0%

3%

3%

3%

% PLAN/2 DIFF

0%

0%

0%

0%

0%

-1%

2%

2%

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000


100%

61,400,000

100

500,000 X 120 = 60,000,000

$$\frac{105,000}{5,840,000} \times 100 = 1.71\%$$



- 1) กรณีที่ผู้จ้างจ้างงานเกินกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างงาน 8 เดือน
- 2) หากผู้จ้างจ้างงานเกินกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างงาน 8 เดือน
- 3) หากผู้จ้างจ้างงานเกินกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างงาน 8 เดือน
- 4) Money
- 5) % PLAN

