

แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่.....จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....
(ชื่อธนาคาร).....รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร).....ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา).....มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ

.....

.....(ชื่อผู้ลงนาม).....

.....(ชื่อธนาคาร).....



แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่..... จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....
(ชื่อธนาคาร).....รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร).....ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา).....มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ


.....(ชื่อธนาคาร).....

**** เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ****



ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน														
ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%	1	2	3	4	5	6	7	8
1	งานก่อสร้างเดิม						เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...
	รายการ.....	ลบ.ม.												
	รายการ.....	ลบ.ม.												
2	งานผิวทาง													
	รายการ.....	ตร.ม.												
	รายการ.....	ตร.ม.												
			รวม		-	0%								

Money														
AccMoney														
% PLAN														
% ACC PLAN														
% ACTUAL														
% ACC ACTUAL														
% ACC DIFF														
% PLAN/2														
% PLAN/2 DIFF														

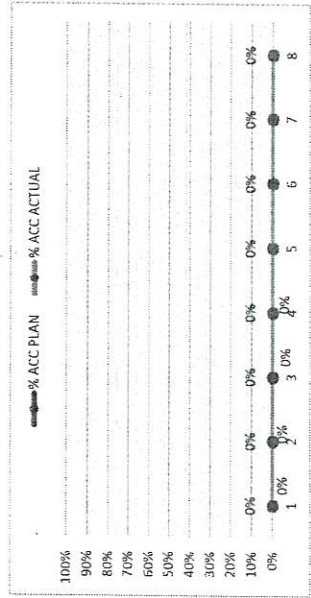


- หมายเหตุ:
- 1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งหมดจำนวน 8 เดือน
 - 2) หมายถึง ระยะเวลาก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างอาคาร 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)
 - 3) ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างตั้งแต่วันของการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
 - 4) มูลค่างานแต่ละรายการ ค่ารวมจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
 - 5) ร้อยละของแผนดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน เมื่อเทียบกับมูลค่างานของงานทั้งหมด




ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานฉาบผิว					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
	รวม				3,040,000	100%

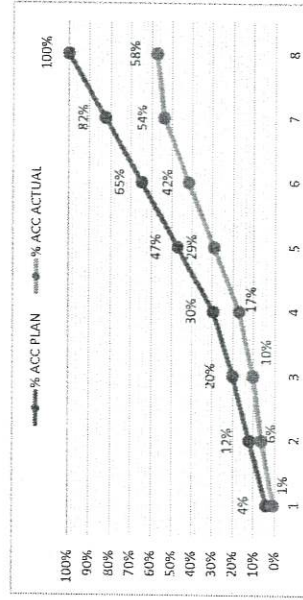

- หมายเหตุ:
- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
 - หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 5 เดือน
 - หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างก่อสร้างตามแผนดำเนินงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานรื้อโครงสร้างเดิม ถือเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้
 - มูลค่างานแต่ละรายการ จำนวนจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
 - ร้อยละของแผนดำเนินงาน จำนวนจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

	1	2	3	4	5	6	7	8
ตค								
พย								
ธค								
มค								
กพ								
มีค								
เมย								
พค								
Money								
AccMoney								
% PLAN								
% ACC PLAN								
% ACTUAL								
% ACC ACTUAL								
% ACC DIFF								
% PLAN/2								
% PLAN/2 DIFF								



ที่

รายการ

หน่วย

ปริมาณงาน

ราคาต่อหน่วย

เป็นเงิน

%

1

งานก่อสร้างเดิม

a1

ลบ.ม.

100

5,000

500,000

16%

a2

ลบ.ม.

120

2,000

240,000

8%

2

งานฉาบทาง

b1

ตร.ม.

400

2,000

800,000

26%

b2

ตร.ม.

300

5,000

1,500,000

49%

รวม

3,040,000


100%

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาเกิน 1 ปี

							รวมระยะเกิน 1 ปี 2																				รวมระยะเกิน 3 ปี 4				รวมระยะเกิน 5 ปี						
ปี	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เงิน	%	เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8	เดือนที่ 9	เดือนที่ 10	เดือนที่ 11	เดือนที่ 12	เดือนที่ 13	เดือนที่ 14	เดือนที่ 15	เดือนที่ 16	เดือนที่ 17	เดือนที่ 18	เดือนที่ 19	เดือนที่ 20											
							กค	กย	ตค	กค	กย	ตค	กค	กย	กค	กย	กค	กย	กค	กย	กค	กย	กค	กย	กค	กย											
1	งานรับใช้	ก.ก.	100	5,000	500,000	8%	20	20	15	15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10					1,990,000						
			120	2,000	240,000	4%					30																			1,990,000							
			150	2,000	300,000	5%			25	20																				1,990,000							
			150	2,000	300,000	5%																								1,990,000							
																														1,990,000							
2	งานบริหาร	ก.ก.	400	2,000	800,000	13%																								1,990,000							
			200	5,000	1,000,000	16%																								1,990,000							
			300	10,000	3,000,000	49%																								1,990,000							
																														1,990,000							
																														1,990,000							
							รวมระยะเกิน 1 ปี 2																								รวมระยะเกิน 5 ปี						
							100,000	100,000	135,000	75,000	-	360,000	410,000	310,000																	1,990,000						
							100,000	200,000	335,000	410,000	410,000	770,000	1,180,000	1,490,000																1,990,000							
							รวมระยะเกิน 3 ปี 4																								รวมระยะเกิน 5 ปี						
							1.03%	1.63%	2.20%	1.22%	0.00%	5.86%	6.68%	5.03%																รวมระยะเกิน 5 ปี							
							1.03%	3.26%	5.66%	6.68%	6.68%	12.54%	19.22%	24.27%																รวมระยะเกิน 5 ปี							
							% ACC PLAN	% ACC PLAN	% ACC PLAN	% ACC PLAN	% ACC PLAN	% ACC PLAN	% ACC PLAN	% ACC PLAN																รวมระยะเกิน 5 ปี							
							% ACTUAL	0%	1%	1%	1%	4%	5%	1%																รวมระยะเกิน 5 ปี							
							% ACC ACTUAL	0%	1%	3%	3%	8%	12%	13%																รวมระยะเกิน 5 ปี							
							% ACC DIFF	1%	2%	3%	3%	5%	7%	11%																รวมระยะเกิน 5 ปี							
							% PLAN/2	1%	1%	1%	1%	3%	3%	3%																รวมระยะเกิน 5 ปี							
							% PLAN/2 DIFF	0%	0%	0%	0%	-1%	-1%	2%																รวมระยะเกิน 5 ปี							
							รวมระยะเกิน 5 ปี																								รวมระยะเกิน 5 ปี						
							105,000	5,840,000	X 100 = 1.71 %																						รวมระยะเกิน 5 ปี						
							100,000	200,000	335,000	410,000	410,000	770,000	1,180,000	1,490,000																รวมระยะเกิน 5 ปี							
							1.03%	1.63%	2.20%	1.22%	0.00%	5.86%	6.68%	5.03%																รวมระยะเกิน 5 ปี							
							1.03%	3.26%	5.66%	6.68%	6.68%	12.54%	19.22%	24.27%																รวมระยะเกิน 5 ปี							
							% ACTUAL	0%	1%	1%	1%	4%	5%	1%																รวมระยะเกิน 5 ปี							
							% ACC ACTUAL	0%	1%	3%	3%	8%	12%	13%																รวมระยะเกิน 5 ปี							
							% ACC DIFF	1%	2%	3%	3%	5%	7%	11%																รวมระยะเกิน 5 ปี							
							% PLAN/2	1%	1%	1%	1%	3%	3%	3%																รวมระยะเกิน 5 ปี							
							% PLAN/2 DIFF	0%	0%	0%	0%	-1%	-1%	2%																รวมระยะเกิน 5 ปี							
							รวมระยะเกิน 5 ปี																								รวมระยะเกิน 5 ปี						
							105,000	5,840,000	X 100 = 1.71 %																						รวมระยะเกิน 5 ปี						
							100,000	200,000	335,000	410,000	410,000	770,000	1,180,000	1,490,000																รวมระยะเกิน 5 ปี							
							1.03%	1.63%	2.20%	1.22%	0.00%	5.86%	6.68%	5.03%																รวมระยะเกิน 5 ปี							
							1.03%	3.26%	5.66%	6.68%	6.68%	12.54%	19.22%	24.27%																รวมระยะเกิน 5 ปี							
							% ACTUAL	0%	1%	1%	1%	4%	5%	1%																รวมระยะเกิน 5 ปี							
							% ACC ACTUAL	0%	1%	3%	3%	8%	12%	13%																รวมระยะเกิน 5 ปี							
							% ACC DIFF	1%	2%	3%	3%	5%	7%	11%																รวมระยะเกิน 5 ปี							
							% PLAN/2	1%	1%	1%	1%	3%	3%	3%																รวมระยะเกิน 5 ปี							
							% PLAN/2 DIFF	0%	0%	0%	0%	-1%	-1%	2%																รวมระยะเกิน 5 ปี							
							รวมระยะเกิน 5 ปี																								รวมระยะเกิน 5 ปี						
							105,000	5,840,000	X 100 = 1.71 %																						รวมระยะเกิน 5 ปี						
							100,000	200,000	335,000	410,000	410,000	770,000	1,180,000	1,490,000																รวมระยะเกิน 5 ปี							
							1.03%	1.63%	2.20%	1.22%	0.00%	5.86%	6.68%	5.03%																รวมระยะเกิน 5 ปี							
							1.03%	3.26%	5.66%	6.68%	6.68%	12.54%	19.22%	24.27%																รวมระยะเกิน 5 ปี							
							% ACTUAL	0%	1%	1%	1%	4%	5%	1%																รวมระยะเกิน 5 ปี							
							% ACC ACTUAL	0%	1%	3%	3%	8%	12%	13%																รวมระยะเกิน 5 ปี							
							% ACC DIFF	1%	2%	3%	3%	5%	7%	11%																							

(500,000 X 20) = 100,000
100

$$\frac{105,000}{5,840,000} \times 100 = 1.71\%$$



- กรณีวิธีคำนวณระยะเวลาก่อนการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาเกิน 1 ปี
- หมายเหตุ: ข้อมูลที่แสดงในตารางนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ข้อมูลจริงจะแตกต่างกันไป
- หมายเหตุ: ข้อมูลที่แสดงในตารางนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ข้อมูลจริงจะแตกต่างกันไป
- Money: ข้อมูลที่แสดงในตารางนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ข้อมูลจริงจะแตกต่างกันไป
- % PLAN: ข้อมูลที่แสดงในตารางนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ข้อมูลจริงจะแตกต่างกันไป

